


№	Категория	Описание	Вероятность	Влияние	Ущерб (в деньгах, если можно посчитать)	Последствия	План митигации
1	Технический	Реализация интеграции с ядром банка зависит от бэклога смежной команды (API транзакций). Сейчас в их команде нет свободного ресурса для выполнения задачи в срок.	3	3	+3 недели к сроку релиза ~450 000 ₽ (доп. часы команды)	Блокировка разработки бэкэнда, срыв дедлайна MVP, невозможность тестирования интеграции	1. Передача проблемы техническому директору 2. Параллельная разработка API 3. Резервный план: упрощённая интеграция для MVP
2	Управленческий	Заказчик присылает новые требования после старта разработки (5 новых User Stories за последнюю неделю). При текущем процессе изменения вносятся без оценки влияния на срок.	3	2	+4 недели к разработке ~600 000 ₽ (если принять все 5 требований)	Размытие MVP, срыв релиза на 4 месяца, выгорание команды, перерасход бюджета	1. Зафиксировать объём работы для MVP 2. Вести документ через который будут вводиться все изменения 3. Все новые требования — в бэклог Релиза 2
3	Организационный	Распределённая команда (Москва + Красноярск, 4 часа разницы). При текущем графике синхронизации теряется до 2 часов рабочего времени ежедневно на ожидание ответов.	2	2	+10% к бюджету разработки ~200 000 ₽ (простой 2 чел. x 2 часа x 40 дней)	Задержка фронта на 5-7 дней, простой тестировщиков, снижение морали команды	1. Вести перекрывающееся окно 4 часа (15:00-19:00 МСК) 2. Daily в 16:00 МСК для всех 3. Документировать все решения в рабочем пространстве
4	Технический	Нехватка устройств для кросс-платформенного тестирования (iOS 15-16, Android 12-14). В команде есть только 3 физических устройства, нужно 20+ для полного покрытия.	2	2	Пропуск 15-20% багов ~100 000 ₽ (репутационные потери) +1 неделя на до-тестирование	Выпуск нестабильной версии, негативные отзывы в сторках, потеря 5% пользователей	1. Аренда облачных устройств (BrowserStack ~50 000 ₽/мес) 2. Приоритизировать тестирование на популярных устройствах 3. Вести бета-тест с фокус-группой
5	Внешний	Изменение регуляторных требований ЦБ РФ в процессе разработки (например, новые правила для совместных счетов).	1	3	+4-6 недель на доработку ~800 000 ₽ возможная полная переделка функционала	Блокировка релиза, необходимость перепроектирования, юридические риски для банка	1. Мониторить новости ЦБ еженедельно 2. Заложить архитектурную гибкость 3. Консультации с юридическим департаментом раз в 2 недели
6							
7							

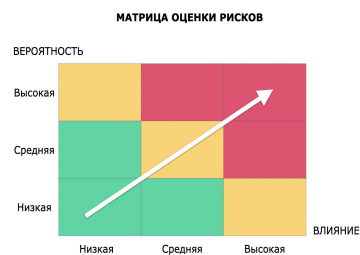

Анализ отклонений и корректировка плана

Отклонение по срокам

Конкретный кейс

Параметр	Значение
Проблема	Задержка интеграции с ядром банка (API транзакций) на 2 недели
Причина	Смежная команда (Ядро банка) не предоставила доступ к sandbox в срок (01.05 → 15.05)
Влияние	Блокировка разработки бэкенда, срыв спринтов 5-6
Критичность	Высокая

API транзакции — это набор правил, позволяющий приложениям (сайтам, сервисам) безопасно обмениваться данными с банками или платёжными системами для инициации, проверки и автоматизации финансовых операций в реальном времени.

Sandbox — это изолированная виртуальная среда для безопасного запуска подозрительных программ, тестирования кода или файлов без риска повредить основную операционную систему.

Инструменты выявления

Инструменты	Как выглядело отклонение	Пример
Jira + Диаграмма Ганта	Задача «Интеграция с ядром банка» сдвинута на 14 дней вправо	План:  01.05-10.05 → Факт:  15.05-24.05
Burndown Chart	Линия фактического выполнения выше плановой	Спринт 5: Осталось 45 SP (план: 20 SP), Отклонение: +125%
Daily Stand-up	Блокер «Ждём доступ к sandbox» повторяется 8 дней подряд	В протоколе Daily: «Блокер не решён» × 8

Это тренд или случайность?

Критерий	Оценка
Частота возникновения	Тренд
Системность проблемы	Системная
Прогноз	Будет повторяться
Вывод	Требуется процессное решение, а не разовое

Корректирующие меры

Мера	Описание	Срок	Ответственный
1. Параллельная разработка с моками	Backend пишет код против mock-сервера API	До 15.05	Tech Lead
2. Эскалация до СТО	Письмо с запросом приоритизации доступа	До 10.05	Project Manager
3. Пересмотр критического пути	Сдвиг задач тестирования на неделю позже	До 12.05	Project Manager
4. Добавление ресурса	Подключение 1 backend-разработчика из другой команды	До 15.05	Resource Manager
5. Процессное решение	Ввести еженедельный синк между командами на постоянной основе	До 01.06	Project Manager

Mock — это «фальшивый» сервис, который ведёт себя как настоящий, но работает локально и предсказуемо.

Обоснование решений

Решение	Обоснование
Моки API	Позволяет продолжить разработку без блокировки, затраты ~50 000 ₹ vs простой команды ~200 000 ₹/неделю
Эскалация	Доступ к sandbox — внешняя зависимость, команда не может решить самостоятельно
Сдвиг тестирования	Тестирование не на критическом пути, можно сдвинуть без влияния на релиз
Доп. ресурс	Ускорит разработку на 30%, стоимость ~150 000 ₹ vs риск срыва релиза ~500 000 ₹
Процессное решение	Предотвратит повторение проблемы в будущих интеграциях

Риски при отсутствии контроля

Риск	Влияние
Срыв релиза на 2-3 недели	Штрафы, потеря доверия стейкхолдеров
Выгорание команды из-за аврала	Снижение качества, текучесть кадров
Накопление технического долга	Проблемы с поддержкой после релиза
Потеря конкурентного преимущества	Конкуренты выпускают аналог раньше

Отклонение по бюджету

Конкретный кейс

Парамаетр	Проблема
Проблема	Увеличение стоимости облачных устройств для тестирования на 40% (BrowserStack: 50 000 → 70 000 ₽/мес)
Причина	Изменение тарифной политики вендора, необходимость расширения покрытия устройств
Влияние	Перерасход бюджета на тестирование: +60 000 ₽ за 3 месяца
Критичность	Средняя

Инструменты выявления

Инструмент	Как выглядит отклонение	Пример
Excel-модель бюджета	Фактические затраты превышают плановые на 15%	План: 200 000 ₽ → Факт: 260 000 ₽, Отклонение: +30%
PowerBI Dashboard	Индикатор бюджета горит жёлтым/красным	Бюджет: 78% использовано, Прогресс: 60% выполнено, Предупреждение: Перерасход 18%
Еженедельный финансовый отчёт	Фактические часы превышают плановые на 12%	Неделя 8: Запланировано 320 часов → Фактически: 358 часов, Отклонение: +38 часов

Это тренд или случайность?

Критерий	Оценка
Частота возникновения	Частично тренд
Системность проблемы	Процессная
Прогноз	Может повториться
Вывод	Требуется внедрение процесса финансового мониторинга

Корректирующие меры

Мера	Описание	Экономия	Срок
1. Оптимизация покрытия устройств	Тестировать на 15 устройствах вместо 20 (популярные модели)	−20 000 ₽/мес	До 20.05
2. Переговоры с вендором	Запросить скидку за годовой контракт	−10 000 ₽/мес	До 25.05
3. Перераспределение бюджета	Использовать резерв 10% из статьи «Управление»	Покрытие +60 000 ₽	До 30.05

Мера	Описание	Экономия	Срок
4. Частичный аутсорс тестирования	30% тестов передать на аутсорс (дешевле на 25%)	–30 000 Р/мес	До 01.06
5. Процесс мониторинга	Ввести ежемесячный пересмотр всех подписок	Предотвращение будущих перерасходов	До 01.06

Аутсорсинг — это передача части задач или процессов внешнему исполнителю (сторонней компании или фрилансерам), вместо того чтобы выполнять их силами собственной команды.

Обоснование решений

Решение	Обоснование
Оптимизация устройств	15 устройств покрывают 95% пользователей (данные аналитики банка), экономия 30%
Скидка за контракт	Годовой контракт даёт 15% скидку, окупается за 8 месяцев
Перераспределение	Резерв 10% заложен именно для таких случаев, не требует согласования спонсора
Аутсорс	Стоимость часа аутсорс-QA на 25% ниже штатного, качество контролируется SLA
Процесс мониторинга	Предотвратит повторение проблемы с другими подписками

Риски при отсутствии контроля

Риск	Вероятность	Влияние
Исчерпание бюджета до релиза	70%	Остановка проекта, заморозка разработки
Необходимость запроса доп. финансирования	80%	Длительное согласование, потеря времени
Сокращение функционала MVP	60%	Удаление фич для экономии, потеря ценности
Репутационные потери для РМ	50%	Снижение доверия к управлению проектом

Отклонение по качеству

Конкретный кейс

Проблема	Значение
Проблема	Снижение покрытия автотестами с 80% до 62% за последние 2 спринта

Проблема	Значение
Причина	Сжатые сроки → команда пропускает написание тестов ради доставки функционала
Влияние	Рост количества багов в production, увеличение времени на регрессию
Критичность	Высокая

Суть: Из-за задержки интеграции с ядром банка (о которой мы говорили в отклонении по срокам) команда оказалась в ситуации «догоняющего графика». (Написать только код → Успеть закрыть задачу → Получить одобрение за скорость.)

Инструменты выявления

Критерий	Как выглядит отклонение	Пример
SonarQube Dashboard	Метрика «Coverage» упала ниже порога 75%	Спринт 3: 82%  → Спринт 4: 74%  → Спринт 5: 62% 
Allure Test Report	Количество упавших тестов выросло на 40%	Спринт 3: 12 failed tests → Спринт 5: 47 failed tests, Рост: +292%
CI/CD Pipeline Stats	Время сборки выросло из-за ручных проверок	Спринт 3: 15 мин (авто) → Спринт 5: 45 мин (ручные проверки), Замедление: +200%

SonarQube — это платформа для непрерывной инспекции качества кода. Она автоматически анализирует исходный код на наличие багов, уязвимостей, покрытия тестами, сложности кода.

Allure Framework — это гибкий инструмент для создания понятных и наглядных отчётов о результатах тестирования.

CI/CD Pipeline Statistics — это метрики, собираемые системами непрерывной интеграции и доставки (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, CircleCI). Они показывают статус каждого этапа, частоту запусков.

Это тренд или случайность?

Критерий	Оценка
Частота возникновения	Тренд
Системность проблемы	Культурная
Прогноз	Будет ухудшаться
Вывод	Требуется срочное процессное и культурное изменение

Корректирующие меры

Мера	Описание	Экономия	Срок
------	----------	----------	------

Мера	Описание	Экономия	Срок
Ввести Definition of Done	Задача не закрывается без покрытия тестами $\geq 80\%$	Возврат к 80% coverage	Немедленно
Выделить спринт на технический долг	Спринт 7: только тесты, рефакторинг, багфикс	Стабилизация кодовой базы	Спринт 7
Автоматизировать запуск тестов	Интеграция автотестов в CI/CD pipeline	Раннее выявление багов	До 25.05
Ввести метрику качества в Daily	Ежедневный отчёт о покрытии тестами	Постоянный контроль	Немедленно
Обучение команды	Воркшоп по написанию эффективных автотестов	Повышение компетенций	22.05

Обоснование решений

Решение	Обоснование
Definition of Done	Предотвращает накопление технического долга, культура качества
Спринт на техдолг	2 недели инвестиций сэкономят 4-6 недель на багфикс после релиза
Автоматизация CI/CD	Раннее выявление багов снижает стоимость исправления в 10 раз
Метрика в Daily	Постоянная видимость проблемы повышает приоритет в команд
Обучение	Повышает скорость написания тестов без потери качества

Риски при отсутствии контроля

Риск	Вероятность	Влияние
Критические баги в production	75%	Потеря данных пользователей, репутационные потери
Увеличение времени на регрессию	90%	Задержка следующих релизов на 30-50%
Технический долг станет неконтролируемым	80%	Потребуется полная переделка архитектуры
Отток пользователей после релиза	60%	Потеря 10-15% пользователей в первый месяц

Коммуникация

Письмо бизнес-заказчику

Тема: Статус проекта «Семейный бюджет» — Отклонения и план корректировок

Уважаемый Заказчик,

Направляю статус по проекту с отклонениями и планом корректировок.

Критические отклонения:

1. Сроки: Задержка интеграции с ядром банка на 2 недели (ТРЕНД)
2. Качество: Покрытие автотестами упало с 80% до 62% (ТРЕНД)

Отклонения среднего уровня:

1. Бюджет: Перерасход на тестирование +60 000 ₽ (15%)

План корректировок:

1. Параллельная разработка с моками API (срок: до 15.05)
2. Спринт на технический долг (Спринт 7)
3. Перераспределение бюджета из резерва

Требуется ваше решение:

1. Подтвердить приоритет интеграции с ядром банка (срок: до 10.05)
2. Утвердить перераспределение бюджета (срок: до 15.05)

Приложения:

- Детальный отчёт по отклонениям [ссылка]
- Обновлённая диаграмма Ганта [ссылка]
- Финансовый отчёт [ссылка]

Готов обсудить на встрече в четверг 11:00.

С уважением,

Project Manager
